



# Deckbleche Wasserkasten = Skizze =

MSS-Bleche 0,8mm ; je 2x fertigen!



Deckblech

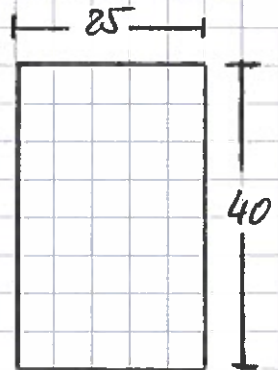

Frontblech


! Die Bleche untereinander können entweder mit 4-Kant MSS + Schrauben verbunden werden, oder man kann sie weich verlöten!

© FWSW 2019  
H. W. H.

Dach = Skizze -

Cu-Blech 111 x 87 x 0,8 ▼

Dachversteifung Summ Sperrholz; 2x festig



© FWWO 2019

H. L. [Signature]

## Kosten aufstellung Kessel & Gehäuse

→ Dom, Kamin, Lima, Rauchkammerstür, Wasserstand, Gasarmaturen, Regler	250,-
→ Mess Blech 0,8mm	30,-
→ Rohmaterial Gastank	10,-
→ Benutzung "Frundwerkstatt"	30,-
→ Kleinteile wie Lampen etc	50,-
→ Verbrauchsmaterial (Bohrer, Gewindeschneider, Sägeblätter etc.)	50,-
	<hr/>
	420 €
+ Fabrikwerk	410 €
	<hr/>
	830 €

# Bautagebuch WEG 8-Kuppler "BUDDY"

- Baubeginn 8.6.19
- 1. Rollprobe ohne Stangen 20.6.19
- 2. " " " lackiert 26.6.19
- 1. Dampfkt Fahrwerk 28.7.19
- Abnahme Fahrwerk 1.8.19
- Lastprobe 1 10.11.19
- " 2 12.11.19
- Endmontage 14.11.-8.12.19
- Endabnahme 9.12.19

→ Bauzeit 6 Monate, 1 Tag ☺

- 1. Pläneinsatz 15.12.19

© 2019 Holger 
